
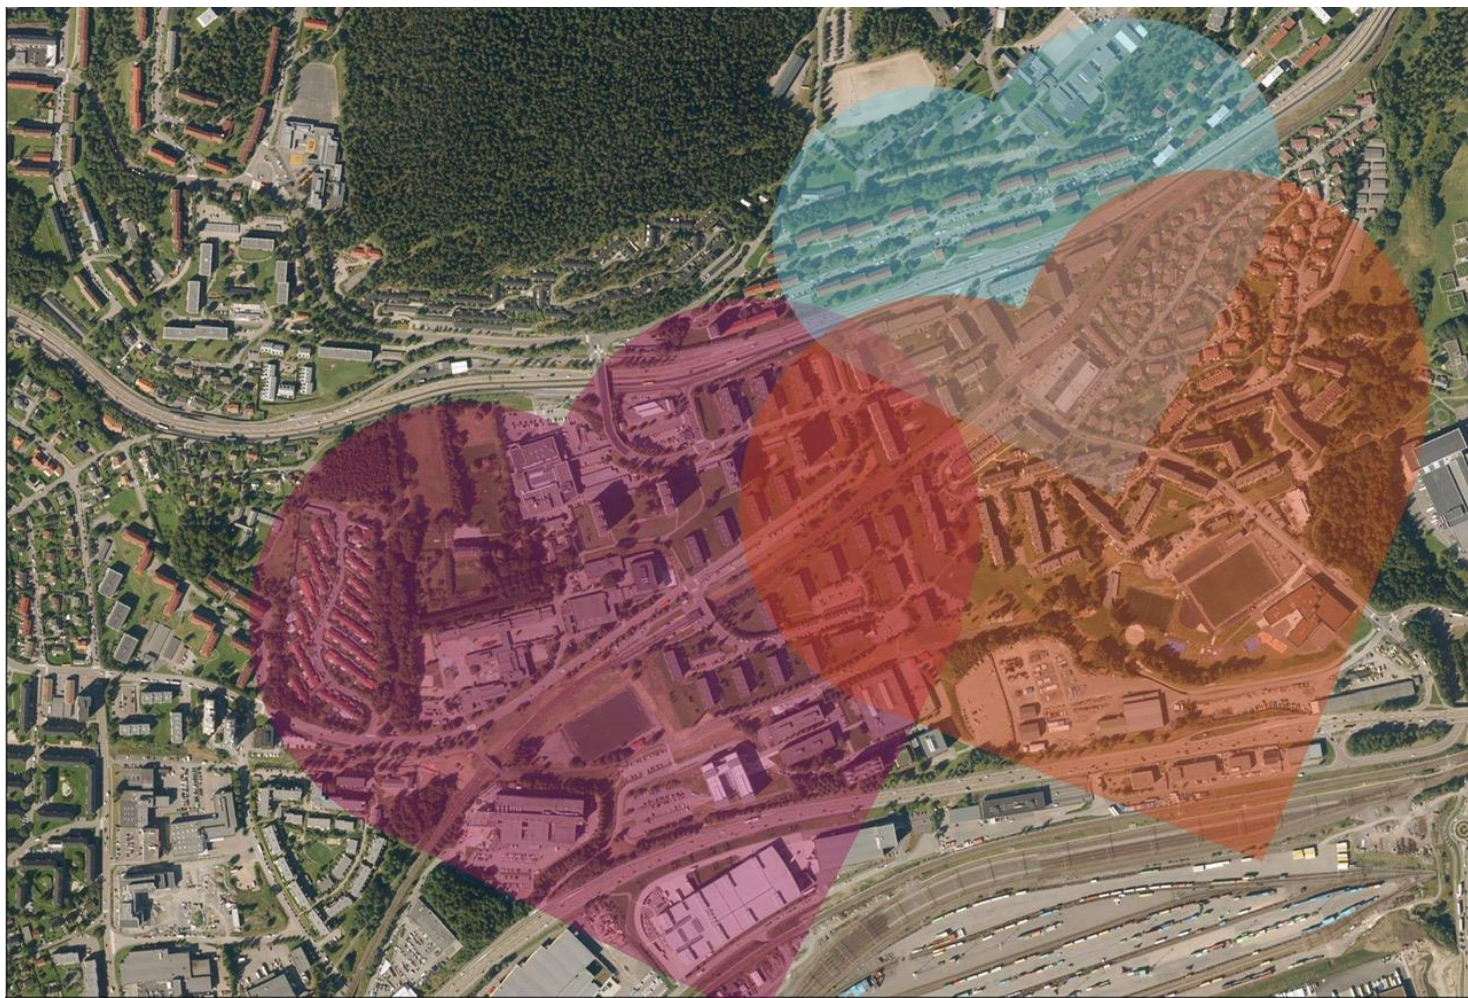


Bydelsutvalgets innstilling

Programplan for områdeløft Bydel Bjerke 2020

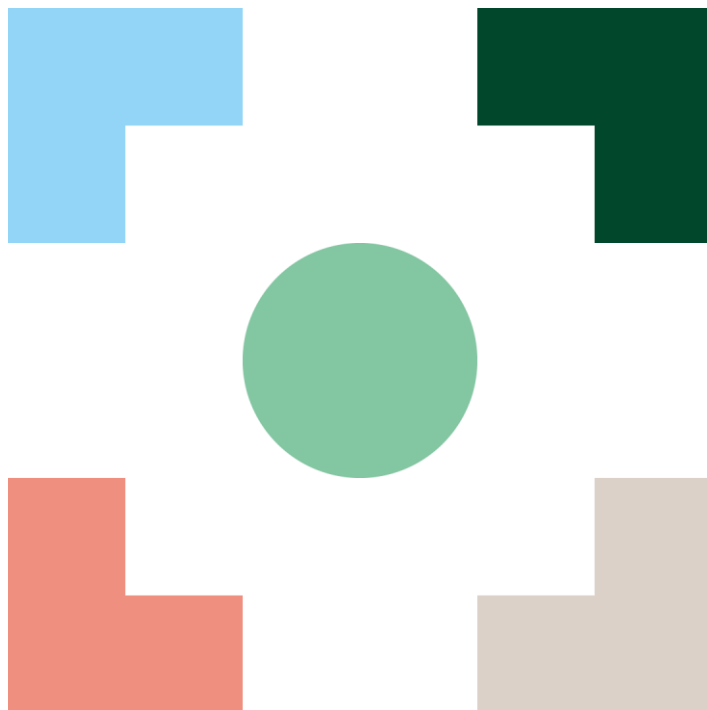

Innhold

Kapittel 1 Bakgrunn og føringer.....	2
1.1 Områdesatsingene i Oslo	2
1.1.1 Delprogram nærmiljø og områdeløft	2
1.2 Lokale styringsdokumenter og føringer.....	3
Bydel Bjerkes strategiske plan	3
Kapittel 2 Utfordringsbildet.....	4
2.1 Generelle utfordringer i Bydel Bjerke	4
2.2 Demografi, ressurser og utfordringer i hvert områdeløft	5
Områdeløft Linderud	5
Områdeløft Sletteløkka / Veitvet.....	7
Kapittel 3 Programplanens mål og innretning	10
3. 1 Overordnet målstruktur og strategi.....	10
3.2 Lokale mål og strategier.....	11
Strategier	11
Områdespesifikke mål og strategier	11
3. 3 Dette vil Bydel Bjerke oppnå med arbeidet i utsatte områder	12
3.4 Strategisk fokus pr. områdeløft i 2020.....	13
3.5 Samarbeidsbehov	14
3.6 Samspill med de to andre delprogrammene	15
3.7 Veien frem til ferdig programplan.....	15
3.8. Organisering av bydelens arbeid	15
3.9 Programdrift.....	16
Kapittel 4 Risikovurdering.....	18
Kapittel 5 Budsjett og finansiering.....	19
Kapittel 6 Videreutvikling av prosjektporteføljen	20
Dokumentoversikt:	21
Vedlegg: Oversikt over prosjekter i Bydel Bjerke.....	22

Kapittel 1 Bakgrunn og føringer

1.1 Områdesatsingene i Oslo

Ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i samarbeid med staten. Områdesatsingene er en av flere strategier innenfor Oslo kommunes områdepolitikk, som ble vedtatt høsten 2017.

Områdesatsingene skal være et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen og ikke erstatte eller finansiere en utvidelse av denne.

Det gjennomføres tre områdesatsinger i Oslo i 2020: Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen. Alle skal pågå til og med 2026.

Områdesatsingene er organisert i tre delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Alle tre delprogram skal bidra til å nå områdesatsingenes overordnede mål:

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltagende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Hvert delprogram ledes av et programstyre og lager sitt eget, årlige handlingsprogram.

1.1.1 Delprogram nærmiljø og områdeløft

Det spesielle med Handlingsprogram for Delprogram nærmiljø, til forskjell fra programmene for Delprogram oppvekst og utdanning og Delprogram sysselsetting, er at hovedtyngden av nærmiljøprogrammet utgjøres av bydelenes lokale programplaner. Alle prosjekter og aktivitet i Delprogram nærmiljø skal støtte opp under det felles hovedmålet:

Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltagende.

Innenfor nærmiljøprogrammet skal det benyttes en felles områdeløftmetodikk: I tidlig fase av et områdeløft gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid. Analyser og bred lokal involvering legger grunnlag for videre planlegging. I planleggings- og gjennomføringsfasen er det avgjørende å mobilisere lokale aktører og andre samarbeidspartnere, både private og offentlige, for å møte lokale behov og utfordringer med et bredt sett av virkemidler.

Hver bydel utarbeider en lokal programplan for det kommende året. Programplanen fungerer som «søknad» om finansiering av den lokale prosjektporteføljen. Planene behandles av programstyret i Delprogram nærmiljø, som innstiller overfor programeiergruppen for områdesatsingene. Programeiergruppen gjør en vurdering av hvordan midlene skal fordeles mellom delprogrammene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting og innstiller overfor byrådet. Byrådet fordeler midlene til slutt.

1.2 Lokale styringsdokumenter og føringer

Bydel Bjerkes strategiske plan

Ny strategisk plan forventes vedtatt i løpet av første kvartal 2020. Planen vil gjelde fra vedtaksdato.

Innenfor p.t. gjeldende strategiske plan er nærmiljøsatsingen forankret i det strategiske innsatsområdet bærekraftig bydelsutvikling hvor områderettet innsats og lokalsamfunnsutvikling er uttalte prioriteringer.

Stedsanalyse, Bydel Bjerke, 2019

Bydelen har gjennom to år gjennomført en omfattende prosess med å innhente dybdekunnskap, bli kjent med nærmiljøet og å forankre eierskapet for nærmiljøsatsingen hos beboere og lokale virksomheter. Den viktigste innsikten fra dette arbeidet er samlet i en stedsanalyse (ferdig des. 2019) som har særlig fokus på hvilke faktorer som hemmer eller fremmer deltakelse i nærmiljøet, med utgangspunkt i temaene (1) fysiske nærmiljøkvaliteter; (2) bomiljø; og (3) sosialt liv og frivillighet. Konklusjonene fra dette arbeidet ligger til grunn for portefølje, prosjekter og leveranser i årets programplan.

Kapittel 2 Utfordringsbildet

2.1 Generelle utfordringer i Bydel Bjerke

I tråd med definisjonen av områdeløft i den vedtatte områdepolitikken, er de geografiske innsatsområdene i Bydel Bjerke avgrenset til delbydeler. Innenfor bomiljøarbeidet vil vi konsentrere innsatsen i de mest levekårsutsatte boligområdene i delbydelene.

1. Delbydel Linderud
2. Delbydel Veitvet (inkludert Sletteløkka)

For øvrig vil Bydel Bjerke i tråd med områdepolitikken ha oppdatert kunnskap om bydelens utvikling mht. demografi, levekår, etc. på lavest mulig geografisk nivå, og vurdere behov for å justere innsatsen underveis, samt vurdere hvorvidt tiltak i omkringliggende områder kan være hensiktsmessig som en del av en helhetlig innsats for å nå målene i nærmiljøprogrammet.

På de fleste sosioøkonomiske og demografiske parametere utpeker Bydel Bjerke seg som en svært delt bydel, med klassiske «øst-vest-skiller» dersom man legger Oslo-målestokken til grunn. Det er store kontraster mellom henholdsvis Sletteløkka, Veitvet og Linderud på den ene siden og Årvoll, Tonsenhagen og Risløkka på den andre. De markante skillene som går mellom delbydeler og områder i bydelen kan potensielt skape større tendenser til utenforskap og konflikter i deler av befolkningen, enn dersom tallene hadde vært jevnt over lave. Områder som statistisk har sosioøkonomiske utfordringer har allikevel først og fremst ressurser. Sletteløkka, Veitvet og Linderud er full av ressurser, både på individnivå og strukturelt. Bydelens nærmiljøinnsats må bygge på disse ressursene og styrke disse.

Skolenes inntaksområder, prinsippet om fritt skolevalg og lokalisering av de ulike skoleslagene (barne-/ungdom/1-10-skoler) forsterker uheldige tendenser i fordelingen mellom elever med norsk som morsmål og elever med et annet morsmål, i tillegg til å forsterke sosioøkonomiske skiller mellom skolekretser. Det er derfor grunn til å se ny områderettet innsats i sammenheng med så vel strukturelle rammevilkår som de store endringene som vil følge av en omfattende byutvikling i Bjerke. Foreldreutvalgene på Linderud skole og Rødtvet skole (som barna fra Sletteløkka sogner til) er oppmerksomme på hvordan skolegrenser, bomiljø og skolemiljø henger sammen, og ønsker dialog med bydelene om dette.

Folkehelseindikatorer forsterker bildet av en delt bydel. Det er betydelige sosiale forskjeller i deltakelse i organisert aktivitet blant ungdom og unge med lavere sosioøkonomisk bakgrunn er mindre fysisk aktiv enn de med høyere sosioøkonomisk bakgrunn, særlig blant jenter. Livsstilssykdommer som spesielt diabetes type 2 er mer utbredt blant beboere fra det subindiske kontinent, derunder Pakistan og Sri Lanka, som er befolkningsgrupper som er godt representert i områdene. Det er mange eldre på Linderud og mange bor alene, og gjennom stedsanalysen avdekker det seg utbredt ensomhet blant eldre og enslige, og mangel på tilbud for denne aldersgruppen.

Bydel Bjerke har gjennom forrige Groruddalssatsing hatt som mål å «trekke bydelen mer sammen» og jevne ut den sosiale og oppfattede avstanden mellom de ulike områdene. I det videre arbeidet med områdeløft på

Linderud vil koblingen opp til byutviklingen i og omkringliggende områder være viktig for en bedre fysisk integrering av delområder. I forbindelse med bomiljøarbeidet på Sletteløkka vil utviklingen i Pottemakerveien og Kakkelvnskroken være av interesse. Noen av tiltakene vil kunne ha som mål å styrke nettverk, møteplasser og mobilisering på tvers av bydelens fem delbydeler.

2.2 Demografi, ressurser og utfordringer i hvert områdeløft

NB! Beskrivelsen av områdene og tall for demografi og levekår i dette kapitlet gjelder situasjonen i oppstartsåret 2017, og ligger fast gjennom programperioden som en «nullpunktsmåling» for områdesatsingen. Hvert avsnitt avsluttes med en kort oppdatering med ny innsikt som begrunner eventuell endring av innsats i kommende periode.

Områdeløft Linderud

Linderud delbydel ligger øst i Bydel Bjerke, og består av områdene Linderud, Økernbråten, Vollebekk, Lunden. Linderud delbydel har ca. 6200 innbyggere som hovedsakelig bor i blokkbebyggelse. Det er også noen rekkehus- og hagebyområder. Vollebekk er et utviklingsområde som frem mot 2024 vil få 800 nye boliger, kulturhus, og utvikles til et nytt sentrum i delbydelen. Delbydel Linderud inneholder for øvrig områder som Bjerkedalen park, Brobekk skolehage (hovedsakelig parsellhager) og Linderud gård, som utgjør en del av områdets potensial.

De viktigste institusjonene og møteplassene er: Linderud skole, Vollebekk skole, Bjerke vgs., Linderud senter, Linne hotell, Bjerke Nærmiljøsenter, borettslag og sameier. Organisasjonslivet er begrenset. De tradisjonelle organisasjonene sliter med rekruttering. Linderud idrettslag er en viktig ressurs i området. Idrettslaget oppfører en ny flerbrukshall i 2020 som vil innebære et løft for barn og unge i området.

Demografi og levekår («nullpunkt» 2017)

I følge EU-60-skala er over 30 % av barnehusholdningene i delbydel Linderud kategorisert som «fattige», og over en tredjedel (34,7 %) av befolkningen bor trangt. Sysselsettingsgraden i delbydelen er på 71 %, mens sysselsettingsgraden på nedre Linderud er på 60 %, og 46 % for kvinner. Andelen med lav utdanning er 31 % i delbydelen, (snitt for Bydel Bjerke er 23 %), mens andelen med lav utdanning på nedre Linderud har ligget jevnt på 55-57 % de siste ti år. Denne type levekårsutfordringer medfører også en opplevelsesfattigdom blant barna i området og knyttes til dårligere folkehelse blant beboerne. Befolkningssammensetningen i delbydel Linderud viser en innvandrerandel på nesten 57 %, mens 72 % av nedre Linderuds beboere har bakgrunn fra Afrika, Asia eller Latin-Amerika (i bydelen som helhet har 45,2 % innvandrerbakgrunn per 1.1.2017). Dette viser et sterkt sammenfall av levekårsutfordringer og etniske skillelinjer, noe som krever helhetlig og samordnet innsats. Familieteamet som følger tett opp ca. 260 familier, hvorav mange bor på Linderud og Sletteløkka, peker på språk og livsstilsrelaterte helseutfordringer som de viktigste barrierene for deltakelse i nærmiljøet og foreldrenettverk.

Utfordrende trekk

Bomiljøet på Linderud er fragmentert og det er lite kontakt mellom beboerne. Det er relativt stor gjennomtrekk av beboere, og få møteplasser. Linderud har mange fattige barnefamilier, og den oppadgående tendensen er bekymringsfull. Barn fra området er underrepresentert på idretts- og

kulturtilbud i regi av frivillige lag og foreninger og på bydelens gratistilbud. Andelen elever som ikke har norsk som morsmål er svært høy på de lavere trinn på Linderud skole, og andelen voksne utenfor arbeidslivet er relativt høy. Inndeling av inntaksområdet for nye Vollebekk skole (som fra 2019 inkluderer ungdomsskoleelever fra Tonsenhagen) forsterker det sosiodemografiske skillet mellom de to skolene som ligger noen hundre meter fra hverandre. Ledelse, driftsstyret og foreldre ved skolen er bekymret for hvilken innvirkning skolegrensene har på skolemiljø, nærmiljø, oppvekstmiljø, og at det vil forsterke et utenforskap blant barn og unge på Linderud. Skolen opplever elevflukt og ustabil elevmasse.

Ressurser og nærmiljøkvaliteter

Linderud IL er en viktig aktør som tilbyr breddeidrett til barn og unge, og de har et spesielt godt tilbud innen håndball og cheerleading. De utmerker seg ved å ta samfunnsansvar gjennom å ha gratis camp med mat to ganger i uken og åpen hall ukentlig. Linderud IL bygger flerbrukshall som også skal ha arealer for aktiviteter for barn og ungdom. Korpset på Linderud er i drift og har musikktilbud til barn i området. Linderudkoret for barn og Linderud-dansen for de litt eldre voksne er eksempler på positive tilbud i hjertet av Linderud.

Foreningene MIR og Aktive kvinner i Bjerke har innendørs trening for voksne, spesielt kvinner, samt turgruppe med ukentlig aktivitet. DNT nærturgrupper har ukentlig turgruppe for seniorer som møtes like ovenfor Linderud senter.

Linderud gård er sentralt plassert i området og er en kulturhistorisk og grønn perle. Bydelen og Museene i Akershus samarbeider tett om utviklingen av Linderud gård som en inkluderende og aktiv møteplass, og gårdens «samspill» med de omkringliggende områder og institusjoner vil være et sentralt tema i en områdeplan for Linderud.

Grønn åre med ulike aktivitetspunkter gir mulighet for gratis utendørs aktivitet for alle aldre. Linne hotell er en stor næring i nærmiljøet som er gode på å tilrettelegge for arbeidstrening og praksisplasser i samarbeid med Nav. Siemens har bidratt til nærmiljøutvikling ved å delfinansiere den nye gangveien på Linderud. Linderud senter er et knutepunkt i bydelen, og fungerer som en stor møteplass. Senteret har samarbeid med skolene og barnehagene i nærmiljøet innen både kunst, sommer/deltidsjobb og elevbedrift.

Områdeløft Linderud vil konsentrere seg om det sentrale Linderud-området og skal styrke en koordinert innsats fra bydelens/kommunens side og et mer forpliktende samarbeid med lokale aktører, inkl. frivillige (foreldrenettverk, idrett, korps), offentlige (skolen, barnehager, etater) og private (boligsameiene, Linderud senter, Linderud gård m.fl.). Det er potensial for større helhetlige grep rundt en fysisk områdeutvikling for å «binde området sammen» og muligens utvide variasjonen av boligtyper på nedre Linderud. Erich Mogensøns vei, Statsråd Mathisens og Linderudveien vil stå sentral i en slik helhetlig plan. Barn og unges oppvekstmiljø står sentralt i områdeløftet.

Oppdatering 2020:

- De lokale ressursene blir stadig synligere og tar en stadig mer aktiv rolle i utvikling og gjennomføring av tiltak på Linderud. Det er etablert arbeidsgrupper innenfor flere temaer.
- En dybdestudie Leieboerforeningen har gjort av bomiljøet på Linderud på oppdrag fra bydelen beskriver tendenser til en strukturell tillitsbrist mellom grupper i befolkningen, der vi - noe forenklet - kan

snakke om minoritetsspråklige barnefamilier som leier bolig på den ene siden og eldre norske som eier egen bolig på den andre, og hvor primært sistnevnte gruppe legger premissene for utviklingen i bomiljøene.

- Gjennom stedsanalyse og kontakt med innbyggerne gjennom tjenester og medvirkningsprosesser kommer det særlig til uttrykk en tydelig etterspørsel etter ungdomstilbud og møteplasser for eldre ungdom i forlengelsen av en generell bekymring blant foreldre og nærmiljø om utviklingen i ungdomsmiljøene.
- Utdanningsetaten har utredet situasjonen på Linderud skole med innspill fra bydel, foreldre og elever, og konkludert med at det er behov for en sammensatt innsats innen drift og utvikling, styrking av sosiale tjenester, oppgradering av skoleanlegg inne og ute, samarbeid med foreldre og nærmiljø, samt åpning for å utrede endring av skoleslag. Her vil det være aktuelt med allokere ressurser fra etaten i tillegg til utviklingsmidler fra delprogram nærmiljø og delprogram oppvekst og utdanning.
- Linderud gård har på bakgrunn av mulighetsstudien fra 2018 gjennomført flere tiltak for å åpne gården opp for befolkningen; klatrepark, gårdsbutikk, parsellhage
- Det er planer/initiativer for utbygging/ombygging på Linderud senter, Bjerke vgs, Linderud gård og Linderud skole, og næringseiendommene på nedre Linderud («Siemens-tomta») er nylig solgt til Stor-Oslo Eiendom og Fearnley som har ambisiøse planer for området.
- Det er et sterkt lokalt ønske at Linderud bad åpnes for lokalbefolkningen. En gruppe beboere jobber engasjert med å påvirke kommunen og idrettskretsen.

Områdeløft Sletteløkka / Veitvet

Delbydel Veitvet består av områdene Sletteløkka og Veitvet. Sletteløkka ligger nord i delbydelen på oversiden av Trondheimsveien, og består av Sletteløkka boligsameie, Askelia borettslag og Kolås boligsameie. Veitvet ligger nedenfor Trondheimsveien og består av borettslag og sameier fordelt på lavblokker og rekkehus/hageby. Samlet befolkning i delbydelen er 6600 innbyggere, hvorav ca. 2500 bor på Sletteløkka.

I delbydel Veitvet er Sletteløkka hovedinnsatsområde, mens en del av innsatsen knyttet til nærmiljøutviklingen bygger på de kvalitetene som finnes på Veitvet.

De viktigste institusjonene for beboerne på Sletteløkka og Veitvet er Linderud senter, Kulturhuset Veitvet, Veitvet Sportsklubb, Rødtvet skole og Veitvet skole.

Demografi og levekår

Veitvet delbydel har den høyeste innvandrерandelen i Bydel Bjerke (66 %), samt den høyeste andelen ikke-vestlige innvandrere med kort botid (6,4 %), også sammenliknet med de øvrige delbydelene i Groruddalen. I delbydel Veitvet er 71 % sysselsatte. Dette tallet er noe lavere for området Sletteløkka med en sysselsettingsgrad på 64 %, hvor andelen sysselsatte er på 71 % for menn og 55 % for kvinner.

Andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er 29,6 %. Dette utgjør en økning med hele tre prosentpoeng fra 2014 til 2015. Samtidig bor godt over en tredjedel (36,8 %) av beboerne i Veitvet

delbydel trangt. Andelen trangbodde er en av de høyeste i Oslo, og har økt de siste årene. Denne utvikling bør ses i sammenheng med økonomiske og materielle forutsetninger for gode levekår. I tillegg kan trangboddhet si noe om trivsel i egen bolig. For eksempel kan det å bo trangt føre til misnøye og ønsker om å flytte, gjøre det vanskeligere for barn å få ro til å gjøre skolearbeid, ha med venner hjem ol.

Sletteløkka er et svært barnerikt område med totalt 2400 innbyggere. Halvparten av befolkningen er under 30 år, og en tredjedel er under 20. På de demografiske parameterne andel innvandrere, første generasjons innvandrere og andel med kort botid ligger Sletteløkka over delbydelsgjennomsnitt. Fra et bomiljøperspektiv uttrykker styrene at dårlige norskkunnskaper begrenser deltakelse.

Sysselsettingsgraden er ca. 71 % for delbydelen, mens for området Sletteløkka er sysselsettingsgraden 64 %. Under forrige områdeløft kom det fram at det særlig er kvinner på Sletteløkka som står utenfor arbeidslivet; området har en sysselsettingsgrad for kvinner på 55 %.

Utfordrende trekk

I nabolaget på Sletteløkka er det svakt beboerenegasje og sosialt nettverk, blant annet fordi området har fravær av innendørs felles møteplasser utenom en Joker-butikk. I tillegg er det høy utleieandel, som medfører en ustabil beboermasse. Resultatet er svak stedstilhørighet til området. Både beboere og bydelens tjenestesteder beskriver tendenser til utvikling av et to-sjikt-samfunn på Veitvet der samfunnsdeltakelsen og nærmiljøengasjementet følger sosiodemografiske skillelinjer.

Barn i skolealder På Sletteløkka sogner til Rødtvet og Apalløkka skole som ligger i Bydel Grorud. En del barn går også på andre skoler. Andelen barn som går i barnehage er 61 prosent for 1-5-åringer, og bydelen jobber for å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger. På kort sikt ser bydelen på mulighet for å finne en løsning med «åpen barnehage». På lenger sikt er det et mål at det etableres nye barnehager. De gamle offisersboligene i Utfartsveien er regulert til barnehage. Det er også behov for en barnehage øst i området. Denne kan ses i sammenheng med utvikling av området Pottemakerveien og Kakkelvnskroken (delvis bydel Grorud). Sletteløkka har behov for flere møteplasser enn det som kan utvikles ved etablering av barnehager. For å lykkes med et områdeløft på Sletteløkka som har langsiktig effekt, må utfordringene og løsningene forankres i styrene i boligselskapene og engasjerte beboere på Sletteløkka. Lokalsamfunnet må engasjeres i arbeidet med å løse de konkrete utfordringene som beboerne selv har pekt på: felleshus, trafikk og parkering, støy, trygg lek og ferdsel, forsøpling, beplantning på fellesområder og aktivitetsområder for barn. Både øvre Veitvet og Sletteløkka har bomiljøutfordringer knyttet til trafikk (støy, forurensning) fra Trondheimsveien. Statens vegvesen har foreløpig ingen planer om å realisere støyskjerming.

Ressurser og nærmiljøkvaliteter

Veitvet har hatt en positiv utvikling etter forrige områdeløft. Kulturhuset Veitvet, ny skole, miljøgate og styrking av kulturlivet er synlige resultater av satsingen. Veitvet sportsklubb har en viktig rolle som nærmiljøaktør, og har opplevd en positiv rekrutteringstendens de siste årene. Klubben har fått til en driftsavtale med Bymiljøetaten for det tidligere aktivitetsskolebygget som ligger i Veitvetparken. Veitvet SK ønsker å utvikle huset til et nærmiljøhus/ grendehus, og har bl.a. fått bomiljøtilskudd fra GDS til det formålet. Kulturhuset Veitvet huser frivillig aktivitet og Nysirkus Bjerke som har aktivitetstilbud til i overkant av 500 barn og unge.

Sletteløkka har kort vei til marka, og Bjerkesirkelen går gjennom området. Det ble gjennomført et områdeløft på Sletteløkka i 2008-2013, der det ble etablert flere utendørs lekeplasser og en ballplass som i dag er hyppig brukt av barna i området. Bomiljøarbeidet resulterte i bl.a. opprettelsen av den beboerdrevne organisasjonen Sletteløkka arrangementer, som fortsatt er en svært aktiv og viktig organisasjon for bomiljøkvaliteten i området. De arrangerer bl.a. gatefest, julegrantenning og turgrupper.

I forrige Groruddalssatsing ble det med utgangspunkt i Stikk innom på Veitvet kartlagt og etablert mange nye organisasjoner. Det er i dag et rikt foreningsliv med organisasjoner som Miljøagentene, IKRA, Bartham school of dance, Den kinesiske skolen, m.fl. som samles i en felles paraply «Veitvet og Sletteløkka Kulturforum». Ved skolen er det sterke foreldreutvalg som bl.a. jobber for å etablere skolehage, tar initiativ til temakvelder for foreldre og natteravngrupper.

Oppdatering 2020:

- Det er et voksende beboerengasjement i området.
- Beboere er i gang med å realisere forsamlingslokale i underetasjen på Joker-butikken
- Sletteløkka Vel er etablert i 2019 som en åpen beboerforening med formål om å bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av Sletteløkka.
- Velferdsavdelingen i bydelen er bekymret for utviklingen i et utsatt boligområde i østre del av Sletteløkka, med «brakkeboliger» med en opphoping av beboere med dårlig helse og boevne, høy gjennomstrømming av beboere. Boforhold og beboersammensetning skaper dårlig bomiljø på og omkring adressen.

Kapittel 3 Programplanens mål og innretning

3. 1 Overordnet målstruktur og strategi

Oversikten viser hovedmål og mål for delprogrammene til 2026, samt delmål og strategier for Delprogram nærmiljø. Delmålene ble vedtatt i 2018.

Hovedmål for områdesatsingene		
Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn		
<i>Delprogram nærmiljø</i>	<i>Delprogram oppvekst og utdanning</i>	<i>Delprogram sysselsetting</i>
Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende	Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet	Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet



Delmål 1	Delmål 2	Delmål 3	Delmål 4	Delmål 5	Delmål 6
Sosialt liv og frivillighet	Medborger-skap	Bomiljø	Fysiske nærmiljø-kvaliteter	Byutvikling	Ny kommunal praksis
Kommunen legger til rette for et variert kultur- og organisasjonsliv og nye former for frivillighet og deltakelse	Innbyggerne bidrar i økende grad til å utvikle eget lokalsamfunn	Bomiljøene er i økende grad velfungerende og oppleves som trygge av beboerne	Bygninger og uteområder brukes og er godt vedlikeholdte, og innbyggere har god tilgjengelighet til viktige funksjoner i og utenfor området	Areal- og infrastruktur-planlegging, bolig- og byutvikling bygger på innsikt i lokale behov og bidrar til å øke områdenes attraktivitet	Kommunen er bedre til å samarbeide innad og utad for å skape gode bo- og oppvekst-miljøer

Delprogrammet har to hovedstrategier for å nå målene:

1. Lokale områdeinnsatser i regi av bydelene
2. Videreutvikle områdeløftmetodikken

Programstyret for Delprogram nærmiljø har vedtatt at delprogrammet ikke skal ha felles, overordnede strategier ut over disse.

3.2 Lokale mål og strategier

Det lokale arbeidet i Bydel Bjerke er innrettet mot de felles målsettinger som for Delprogram nærmiljø. Dette innebærer at hovedmålet for nærmiljøarbeidet er at

Nærmiljøkvaliteter på Veitvet, Sletteløkka og Linderud skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende

Strategier

1) Styrke bydelens tjenester og kommunikasjon med befolkningen i innsatsområdene

Bydelen etablerer lokalkontor, styrker kommunikasjonsarbeidet og vil knytte flere tjenester opp mot innsatsområdene.

2) Bidra til at lokalmiljøet selv er i stand til å løse lokale utfordringer

Styrke nettverk mellom beboere, støtte opp under lokale initiativ og benytte metoder for medvirkning og beboerinvolvering for å bidra til at innbyggerne og lokale virksomheter samarbeider om å styrke nærmiljøkvaliteter og å løse utfordringer i eget lokalmiljø.

3) Bidra til at overordnede prosesser og planer er i tråd med lokalmiljøets interesser

Noen utfordringer lar seg ikke løse gjennom bydelens virkemidler eller mobilisering av lokalsamfunnet, men handler om overordnede og strukturelle hindringer. Bydelen vil jobbe for at helhetlige og langsiktige områdegrep, kommunale planer og strategier påvirker innsatsområdene positivt.

Områdespesifikke mål og strategier

Mål		Delmål	Strategier
Linderud			
L1	Det finnes gode og relevante møteplasser for sosialt samvær, u-/organisert aktivitet og mestring, tilpasset ulike målgrupper	1, 2, 4,	• Utvikle nye og forbedre eksisterende nærmiljøkvaliteter og møteplasser • Midlertidig aktivering og testing av potensielle møteplasser • Jobbe for å få bibliotek til Linderud senter • Samarbeide med idrettslag, skoler, boligsameier om bruk/aktivitet i lokaler
L2	Det er et rikt organisasjonsliv der voksne, unge og barn kan være aktive og bygge sosiale relasjoner	1, 2	• Nettverksbygging • Støtte opp under og forsterke eksisterende organisasjoner, engasjement og initiativ
L3	Voksne generelt og foreldre spesielt deltar aktivt i å skape trygge oppvekstmiljøer, og det eksisterer gode nettverk mellom voksne	1, 2, 3	• Mobilisere foreldre via ulike kontaktflater • Koble beboere på eksisterende lokale initiativ og prosesser

L4	Innbyggerne opplever trygghet der de bor, og deltar aktivt i å påvirke eget bomiljø		• Samarbeide med boligselskapene og andre ressursmiljøer knyttet til leietakeres rettigheter, plikter og deltakelse • Bidra til en organisering av beboere • Bidra til at borettslag og sameier nyttiggjør seg bomiljøtilskudd-ordningen
L5	Det er gode forbindelser og sammenheng mellom boligområder, funksjoner og aktivitetsarenaer på Linderud.	4, 5	• Samarbeide med grunneiere, forvaltere og virksomheter på Linderud om en helhetlig områdeutvikling • Midlertidig aktivering
Sletteløkka/Veitvet			
VS1	Det finnes flere inkluderende møteplasser for arrangementer og sosialt samvær	1, 2, 3	• Samarbeide med beboere, foreninger og boligselskapene om å etablere et forsamlingslokale • Støtte opp under beboerinitierte aktiviteter
VS2	Sletteløkka har flere offentlige funksjoner og tilbud til befolkningen	4, 6	• Jobbe for å etablere barnehage i hver ende av Sletteløkka
VS3	Innbyggerne opplever trygghet der de bor, og deltar aktivt i å påvirke eget bomiljø	3	• Samarbeide med boligselskapene, velforening og andre ressursmiljøer knyttet til leietakeres rettigheter, plikter og deltakelse • Bidra til at borettslag og sameier nyttiggjør seg bomiljøtilskudd-ordningen
VS4	Utemiljøet er trygt, grønt og godt tilrettelagt for barn	3, 4	• Bistå beboergrupper, velforening og styrene i arbeidet med støy, trafiksikkerhet og parkeringsproblematikk • Bistå i arbeidet med en helhetlig utviklingsplan
VS5	Veitvetparken er en arena for helårs friluftaktivitet og en trygg møteplass for alle aldersgrupper	1, 3, 4	• Samarbeide med skolen, idrettslag, foreninger, nabolag om aktiviteter og arrangementer • Bistå sportsklubb og nærmiljø i utvikling av «grendehus» i SFO-bygget

3. 3 Dette vil Bydel Bjerke oppnå med arbeidet i utsatte områder

Bydelen vil fokusere på å styrke beboernes samfunnsdeltakelse, skape trygge bomiljøer med gode møteplasser samt en helhetlig og sammenhengende fysisk utvikling av områdene. Derfor legger vi vekt på å støtte opp under beboerinitierte prosjekter og tiltak, samarbeide med boligselskaper og fagmiljøer for å styrke beboeres innflytelse i borettslag og sameier, samt jobbe for at kommunens ulike innsatser innrettes på en måte som kommer lokalmiljøet til gode, herunder et helhetlig planarbeid for fysisk områdeutvikling. Alle prosjekter baserer seg på tett innbyggjerdialog, og knytter et voksende beboerengasjement opp mot utvikling av gode møteplasser inne og ute i innsatsområdene. Trivsel, trygghet og tilgjengelighet er kvalitetsmarkører for den helhetlige innsatsen.

3.4 Strategisk fokus pr. områdeløft i 2020

Strategisk fokus 2020	Viktigste leveranser 2020
Linderud (2017-2026)	
Økt samfunnsdeltakelse og tillit Styrke deltakelseskulturen og sosiale nettverk, foreldreengasjement	- Kontinuerlig innbyggerdialog i form av stormøter, arbeidsgruppemøter og kontakt med styrer, foreninger. - Tildeling av økonomisk støtte til beboerdrevne tiltak og prosesser
Trygge, trivelige og inkluderende bomiljøer Samarbeid med boligsameiene om bomiljøtiltak, leietakerproblematikk og beboermobilisering	- Tiltak for å styrke beboerdemokrati og deltakelsen i bomiljøet, herunder samarbeid med sameiene om et bomiljøseminar for styrene, blokkontakter, bomiljøutvalg, etc. - Samarbeidstiltak med beboergrupper om rydding og forskjønning av gangvei
Inkluderende møteplasser Skape arenaer for mestring og samhandling, inne og ute. Jobbe for bibliotek på Linderud og tilgjengelighet på lokaler	- Plan for etablering av Linderud bibliotek - Konsept og uttesting for aktiv mestringsarena i Siemens-bygget - Utrede mulighet for bruk av vaktmesterboligene på Bjerke vgs / Linderud
Helhetlig områdeutvikling Sikre helhet og sammenheng mellom parallelle utviklingsløp hos ulike grunneiere på Linderud. Jobbe for et torg i sentrum av området	- Fysisk utviklingsplan som er forankret hos grunneiere, beboere og planmyndigheter. - Fysiske oppgraderinger av gangveisystem - Fysiske tiltak for åpning av Linderud gård; porter, belysning
Konsentrert innsats av kommunikasjon og tjenester Sikre sammenheng mellom bydelens tjenester, og styrke samarbeid med skolen. Samarbeid på tvers av delprogrammer.	- Medvirkning og samarbeid med Linderud skole om nærmiljøtiltak, bl.a. samarbeid i valgfaget «Innsats for andre» om tema nærmiljø. - Styrking av bydelens tjenester i området gjennom et «Linderud»-program i samarbeid med delprogram oppvekst og utdanning, utdanningsetaten og skolen. - Drift av områdekontor, inkl. diverse beboerdrevne tilbud
Sletteløkka/Veitvet (2017-2026)	
Økt samfunnsdeltakelse Styrke deltakelseskultur og sosiale nettverk, foreldreengasjement	- Støtte til beboerdrevne tiltak og arrangementer - Kontinuerlig innbyggerdialog (møteserie i programråd, arbeidsgrupper, beboermøter).
Trygge, trivelige og inkluderende bomiljøer Trygging av uteområder for lek, ferdsel,	- Samarbeid med velforening, sameier, borettslag og leieboerforeningen - Støtteordning «strømidler» for små lokale bomiljøtiltak

skolevei (trafikk, parkering, brøyting og vedlikehold). Samarbeid med boligsameiene om bomiljøtiltak og leietakerproblematikk	- Samarbeide med velforening, styrer, kommunale etater om trygghetstiltak
Trygge, inkluderende og aktive møteplasser Beboerdrevet dugnad for grendehus Utendørs møteplasser for aktivitet (lekeplasser, skøytebane/akebakke, parsell) Legge til rette for at nærmiljøet tar i bruk eksisterende møteplasser	• Innrede grendehus på Sletteløkka med gjenbruksmaterialer, bygd på dugnad • Lysfest Veitvetparken • Skolehage i Veitvetparken • Samarbeid med Veitvet SK om grendehus i parken • Åpning av drømmeklubben
Konsentrert innsats av kommunikasjon og tjenester Jobbe for etablering av barnehage i begge ender, dialog med foreldre for rekruttering til barnehage, punktinnsett bomiljø «brakkeboliger»	• Drift av «Møteplass 21B» - leilighet for rekruttering til barnehage. Finansiert av andre midler, men tett samarbeid med nærmiljø • Bomiljøvakt • Innsiktsdokument barnehagebehov

3.5 Samarbeidsbehov

Kort oversikt over viktige samarbeidspartnere i områdene og i kommune/stat. Lokalt er bydelen i jevnlig dialog med alle de nevnte aktørene. Bydelen vil inngå samarbeidsavtaler der det er hensiktsmessig.

Områdeløft	Lokale aktører (og ikke-kommunale)	Kommunale og statlige aktører (Se for øvrig kap. 3.8.)
Linderud	- Borettslag og sameier – etablert dialog, søke tettere samarbeid om bomiljøetsatsing - Linderud gård (Museene i Akershus) * - Linderud senter (Citycon) - Linderud IL – bydelen vil søke tettere samarbeid i 2020 ifm porteføljeutv. - FAU ved Linderud skole - Andre lokale foreninger (Aktive kvinner i Bjerke, Brobekk skolehage, Bjerke barn- og familieforening, Bydelsmødrene*, MIR). - Leieboerforeningen* - Befolkningen forøvrig	- Linderud skole – etablert samarbeid - Bjerke vgs – etablert dialog, vil søke tettere samarbeid - PBE, BYM, OBY, UDE, EBY – Bydel Bjerke vil initiere tettere samarbeid i 2020 - Deichman – felles søknad, etablert samarbeid
Sletteløkka/ Veitvet	- Borettslag og sameier* - Sletteløkka Vel* - Sletteløkka arrangementer* - FAU ved Rødtvet skole - drifter av Joker-butikken - Veitvet sportsklubb - Veitvet og Sletteløkka kulturforum - FAU Veitvet skole	- Veitvet skole – bydelen har tett dialog - Bydel Grorud – evt tettere dialog om utviklingen i Pottmakervn/ Kakklovnskroken - PBE, BYM – bydelen tar initiativ til tettere samarbeid - Krigsskolen – BBJ initierer muligens samarbeid ifm porteføljeutvikling

*) Formalisert samarbeid gjennom avtaler, programråd eller felles søknader

3.6 Samspill med de to andre delprogrammene

I Innsatsen på Linderud er det et tett samarbeid mellom bydelen, Linderud skole og utdanningsetaten. Det er et tett samarbeid med delprogram oppvekst og utdanning i utvikling av prosjekter og etablering av en bredere samarbeidsplattform.

3.7 Veien frem til ferdig programplan

Porteføljeutvikling

Arbeidet fram til ferdig programplan består av kunnskapsinnhenting, utstrakt innbyggerdialog, innspill fra tjenester og faglige bearbeiding i bydelen. Porteføljeutviklingen er forankret hos utviklingsdirektøren i bydelen, og ledergruppen er løpende orientert og involvert der det er hensiktsmessig.

Årets programplan baserer seg på følgende trinn:

1. Stedsanalysen er viktig kunnskapsgrunnlag (kvantitative og kvalitative undersøkelser gjennom ett år).
2. Lokale prosesser:
 - Sletteløkka: lokalt programråd med representasjon fra borettslag/sameier, foreninger og enkeltbeboere.
 - Linderud: (A) Beboernettverk som møtes hver 6.-8. uke; B) Grunneierforum som er referansegruppe for arbeidet med fysisk plan;
3. Interne prosesser:
 - Innspill fra tjenestene om hvordan nærmiljøprogrammet kan løse problemer de møter i tjenesteutøvelsen.
 - Sondering med etater
4. Samordning ved programleder og prosjektlederteam for nærmiljø.

Beslutningsprosess

Siste utkast til programplan sendes for innspill hos lokale samarbeidspartnere og behandles i bydelsdirektørens ledergruppe før politisk behandling.

Programplanen går til alle bydelens råd og utvalg, og vedtas i BU som en innstilling til programstyret.

3.8. Organisering av bydelens arbeid

I bydelen:

Arbeidet med nærmiljøprogrammet i Bydel Bjerke følger prosjektveiviseren. Programmet er knyttet tett opp til bydelens strategiske plan, og skal forsterke bydelens arbeid med barnefattigdom, mestring og lokalsamfunnsutvikling. Styringen er forankret i bydelsutvalget. Direktørens ledergruppe har den løpende programstyringen, delegert til utviklingsdirektøren. Utviklingsavdelingen har overordnet ansvar for koordinering av hele Groruddalssatsingen i bydelen, og rapporterer jevnlig til ledergruppen. Prosjekteiere er de respektive avdelingsdirektørene, evt. delegert videre til mellomledere. I noen prosjekter vil prosjekteierne være utenfor bydelen. Gjennomføringsansvaret for nærmiljøprogrammet ligger i seksjon for samfunn og nærmiljø i utviklingsavdelingen, der seksjonssjef har programlederrollen. Prosjektlederne er i hovedsak organisert i samme seksjon, mens noe prosjektledelse og prosjektarbeid utføres i andre avdelinger.

I lokalmiljøet

Både utvikling og gjennomføringen av prosjekter og tiltak skjer i svært tett samarbeid med nærmiljøaktører.

For områdeløft Sletteløkka er det etablert et programråd bestående av representanter for sameier og borettslag, velforening, Sletteløkka arrangementer, ulike beboerrepresentanter.

For områdeløft Linderud skjer forankringsarbeidet langs to linjer:

- Regelmessige beboermøter med et voksende nettverk av beboere, samt arbeidsgrupper innenfor definerte temaer
- Grunneierforum av private og kommunale grunneiere og virksomheter for å skape en felles strategi for den fysiske utviklingen i området.

I kommunen for øvrig

Bydel Bjerke vil bruke områdeløftmetodikken til å utvikle og operasjonalisere kommunens vedtatte områdepolitikk, og jobber for å styrke det kommunale samarbeidet i innsatsområdene for å bidra til at vi opptre som «én kommune» i møte med befolkning, grunneiere og virksomheter. I arbeidet med Linderud og Sletteløkka/Veitvet er det behov for bedre en intrakommunal samordning mellom BBJ, BYM, UDE, OBY, EBY, PBE og Deichman, samt lokale tjenestesteder som barnehager og skoler. Bydelen tar en koordinerende rolle og vil bidra til bedre informasjonsflyt mellom de berørte kommunale instansene i saker som berører områdene, samt få en fastere struktur på samarbeidet gjennom mer definerte samarbeidsgrupper og samarbeidsavtaler.

3.9 Programdrift

Nærmiljøarbeidet i Bydel Bjerke er programorganisert. Det innebærer en helhetlig, langsiktig og strategisk tilnærming til de målene som bydelen har satt i sin strategiske plan, der bydelens rolle som lokalsamfunnsutvikler forsterkes og videreutvikles. Innovasjon og metodeutvikling står sentralt i utviklingen av Bydel Bjerke som organisasjon og i samarbeidet med eksterne aktører; både offentlige, private og frivillige, samt i dialogen med lokalbefolkningen. Den årlige driften av programmet har tre hovedkomponenter:

- gjennomføring av vedtatt programplan
- utvikling av prosjekter og portefølje
- utvikling av ny metodikk for bydelens rolle som lokalsamfunnsutvikler

Programstyringen er knyttet tett opp mot bydelens strategiske plan, og fordrer inngående lokal kjennskap og kunnskap om befolkningen og utviklingstrekk i de geografiske innsatsområdene. Dialog og samskaping med lokalbefolkning og lokale aktører er avgjørende.

Bydel Bjerke etterstreber tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid i gjennomføringen av prosjektene. Noen prosjekter og leveranser er knyttet til den overordnede programstyringen mens andre begrenser seg til det enkelte området. Noen prosjekter er knyttet opp til bydelens tjenesteproduksjon mens andre er i hovedsak forankret hos nærmiljøaktører.

Kommunikasjon

Bydelen har en dedikert ressurs for å styrke dialogen med befolkningen i innsatsområdene, og har åpnet et kontor på Linderud senter i tråd med et tydelig ønske som kom til uttrykk i innbyggerundersøkelsen. Bydelen har styrket kommunikasjonsarbeidet med den delen av befolkningen vi ikke når gjennom de tradisjonelle kanalene, og bruker bl.a. film og visuell kommunikasjon som sentrale verktøy.

Personal og drift

Bydelen søker om midler til en programleder, en kommunikasjonsressurs og drift av områdekontoret. Lønnsmidler for øvrig er knyttet til gjennomføring og utvikling av prosjekter og leveranser. Det søkes om støtte til fire fulltids prosjektledere tilknyttet programorganisasjonen i bydelen.

I tillegg søkes det om ressurser til å koble fagressurser i linja på arbeidet med trygge bomiljøer med utvikling av tiltak i velferdsavdelingen og oppvekstavdelingens på henholdsvis Sletteløkka og Linderud. På vegne av Deichman søkes det om prosjektledelse og driftsressurser til å utrede og pilotere bibliotek på Linderud senter.

Øvrige ressurser

Bydelen forsterker tjenestene i innsatsområdene og anslår at to årsverk er knyttet opp mot nærmiljøinnsatsen, herunder ressurser til tjenstedesign, kultur og frivillighet, oppveksttiltak i innsatsområdene.

Bydelen har for øvrig fått støtte fra delprogram Oppvekst og utdanning til å konsentrere innsats på språk i barnehagene på Linderud. Vi samarbeider med Linderud skole om en helhetlig innsats for forsterking av fysisk og sosialt skolemiljø, og nærmiljøprogrammets innsats på Linderud har bidratt til utdanningsetatens utredning av Linderud skole som utløser friske midler fra etaten for styrking av skolen.

Bydelen har mottatt ekstraordinære midler fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til forsterket innsats innen rekruttering til barnehage. Dette finansierer en personalressurs og lokale på Sletteløkka.

Bydelen har mottatt BOSin-midler til konsentrert innsats overfor familier på Linderud for å bidra til at flere blir boende i området.

Kapittel 4 Risikovurdering

Risiko	Konsekvens (1-3)	Sannsynlig- het (1-3)	Produkt/ risikonivå	Mottiltak
For lite ressurser til å gjennomføre programmet	3	1		Søke midler gjennom GDS og andre kilder. God ressursplanlegging. Forankring i bydelens ledelse.
Manglende deltakelse og interesse i befolkningen og blant lokale aktører	3	2		Forankring og mobilisering av befolkningen står sentralt i alt arbeid i 2020, og det vil prøves ut nye tilnærminger der man ikke lykkes med en gang. Systematisk bruk av samarbeidsavtaler med lokale nøkkelaktører
Manglende forankring på tvers i bydelsorganisasjonen	2	2		Groruddalssatsingen generelt og programplan for nærmiljø spesielt er forankret i politisk og administrativ ledelse. Prosjekteier, prosjektledelse og gjennomføring knyttes til relevant avdeling/ seksjon/ tjenestested. Bydel Bjerke bygger kompetanse innen utvikling, innovasjon, program-/prosjektarbeid i egen organisasjon.

Kapittel 5 Budsjett og finansiering

GDS – nummer	Prosjektets navn	Estimert overført fra 2019 *	Finansiering fra GDS - søknadssum 2020 *	Finansiering fra bydel 2020	Forventet annen finansiering 2020	Estimert total- budsjett 2020
Programutgifter						
2.1-17	Programdrift	418.750	1.981.250			2.400.000
2.2-17	Porteføljeutvikling	774.333	725.667			1.500.000
Områdeløft Linderud						
2.2-19	Fysisk utviklingsplan	55.755	1.244.245			1.300.000
2.3-19	Bomiljø Linderud	-7.791	1.007.991			1.000.000
2.7-17	Linderud gård	42.314	457.686			500.000
2.9-17	Vollebekk fabrikk	134.140	765.860			900.000
Ny	Midlertidig aktivering	0	1.500.000			1.500.000
2.1-19	Ungdoms-Aks	354.632	145.368			500.000
Ny	Trygghetsprosjekt	0	2.000.000			2.000.000
Ny	Bibliotek Linderud (Deichman)	0	2.300.000			2.300.000
Områdeløft Sletteløkka/Veitvet						
2.1-18	Møteplasser	327.467	1.422.533			1.750.000
2.4-19	Bo godt på Sletteløkka	-139.949	1.139.949			1.000.000
Ny	Bomiljøvakt		1.400.000			1.400.000
2.5-19	Veitvetparken(BBJ)	528.595	171.405			700.000
2.5-19	Veitvetparken (BYM)**		1.000.000			1.000.000
2.6-19	Drømmeklubben	353.885	-303.885			50.000
	TOTALT	2.842.128	16.957.872			19.800.000

*) FORELØPIG. Basert på regnskapstall pr 31.12.19. Vil justeres ved regnskapsavslutning. Det kan forekomme omposterings mellom prosjekter.

**) Bymiljøetaten har fått tildelt 2.450.000 i 2019 til belysning i Veitvetparken. Eventuelle overførte midler til dette investeringstiltaket kommer på toppen av totalbudsjettet.

Kapittel 6 Videreutvikling av prosjektporteføljen

Møtesteder og mestringsarenaer for eldre ungdom

Stedsanalysen, innbyggerdialog for øvrig og innspill fra tjenestene gir svært tydelige signaler om behovet for et møtested for eldre ungdom og unge voksne, med fokus på mestring, aktivitet og positive rollemodeller. Alle innsatsområdene har en ung befolkning; Sletteløkka utpeker seg med halvparten av befolkningen under 30 år, og 1/3 under 20. Deltakelse i organisert aktivitet er lav sammenliknet med Oslo for øvrig. Bydelen vil i 2020 søke samarbeid med eksterne aktører, samt vurdere hvordan egne eksisterende og planlagte møteplasser kan møte dette behovet. Gjennom trygghetsprosjektet, ungdoms-aks og samarbeidet med skolene kan det utvikle seg nye prosjekter eller tiltak.

Utvikling av idrettslagenes rolle i lokalsamfunnet

Det er to velfungerende idrettslag i innsatsområdene; Linderud IL og Veitvet sportsklubb. Begge idrettslagene tar i dag et lokalsamfunnsansvar ved å tilby gratis aktiviteter av ulike slag for barn og familier i nærmiljøet. Linderud IL bygger en ny hall som skal stå ferdig i 2020. Veitvet sportsklubb disponerer det gamle SFO-huset i Veitvetparken som de ønsker å utvikle til et «grendehus». Bydelen har pr i dag en samarbeidsavtale med idrettslagene. Disse vil fornyes og knyttes tettere opp mot nærmiljøarbeidet.

Skole, utdanning og nærmiljø

Både på Linderud og Sletteløkka er beboerne opptatt av skolens rolle i nærmiljøet.

På Linderud er bydelen og skolen i gang med å skape en samarbeidsplattform og en bedre koordinering av innsatsen på språk, overgang barnehage-skole og foreldresamarbeid gjennom delprogrammene oppvekst og nærmiljø, etter inspirasjon fra Romsås. Dette arbeidet styrkes og videreutvikles i 2020. Rapporten fra utdanningsetaten om Linderud skole konkluderer dessuten med behovet for å gjøre fysiske oppgraderinger av skoleanlegget både ute og inne. Det kan være aktuelt å bruke virkemidler fra nærmiljøprogrammet til noen tiltak i den forbindelse. Utdanningsetaten og Undervisningsbygg har invitert bydelen, Linderud skole og Bjerke vgs til en prosess for å ta i bruk to tidligere vaktmesterboliger i bygningsmassen på Bjerke vgs. Det er et ønske fra alle parter at lokalene disponeres til aktivitet både på dagtid og kveldstid i en modell for sambruk mellom ulike institusjoner og brukergrupper, med vekt på skoleungdom og foreldre.

Barn på Sletteløkka fordeler seg på mange ulike skoler, og det er et uttalt ønske fra FAU på Rødtvet om et tettere samarbeid mellom bydelene (Grorud og Bjerke), skolen og nærmiljøet.

Samarbeidet med foreldreutvalgene vil være sentral i det videre arbeidet med prosjektutvikling.

Fysiske tiltak

I løpet av 2020 vil bydelen i dialog med lokalmiljø og grunneiere vurdere og prioritere behov for fysiske investeringer i innsatsområdene. Det kan komme ytterligere søknad om tilskudd i løpet av året.

Dokumentoversikt:

- Folk og steder. Antropologisk nærmiljøstudie av Linderud – Veitvet – Sletteløkka. *Kvalitativt bidrag til stedsanalyse*. 2018, Habeo, Byantropologene.
- Den beste blokka på feltet, dybdestudie av bomiljøet på Linderud. Leieboerforeningen, 2019
- Praktisk medvirkning som metode for økt eierskap og engasjement hos elever på Linderud skole. 2018, Byverkstedet.
- Linderud gård, mulighetsstudie. *Herskapelig og folkelig – Et levende museum i hjertet av Groruddalen og en destinasjon for hele Oslo.*, Kulturutviklerne og MiA (Museene i Akershus), 2018
- Rapport om Linderud skole, Utdanningsetaten, 2019

Vedlegg: Oversikt over prosjekter i Bydel Bjerke

Prosjekt	2.2-19	FYSISK UTVIKLINGSPLAN LINDERUD
varighet	2019 – 2021	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	Samarbeid med Plan- og bygningsetaten og BYM er initiert og ønskes videreført og intensivert. Dialog med lokale grunneiere og virksomheter er initiert og vil formaliseres i avtaler.	
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept: 01.19 – 04.19 Planlegging: 04.19 - 08.19 Gjennomføring: 09.19 - 06.21 Avslutning: 07.21- 12.21	
Søknadssum	1.300.000	
Kostnader	Prosjektledelse Arkitektfaglig kompetanse for utforming av plan Midlertidige tiltak – medvirkning	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Linderud har flotte grønne, historiske og arkitektoniske kvaliteter. Beboerne og lokale virksomheter har imidlertid pekt på endel barrierer som hindrer at alle kan delta aktivt i sitt fysiske nærmiljø. Blant annet opplever beboere at noen tilbud og kvaliteter er lite tilgjengelige og noen områder oppleves som mørke, utrygge eller dårlig vedlikeholdte. Det er behov for flere møteplasser, lekeplasser, aktivitetsområder. Flere av grunneierne har utviklingsplaner som bør ses i sammenheng: Linderud senter vil utvide senteret og vurderer muligheten for boliger. Siemensbygget / Oslo business park er et mulig utviklingsområde hvor både bolig og næring er vurdert. Linderud gård er pr i dag i en situasjon hvor de ikke har noen godkjent adkomstvei til gården, og er i prinsippet «stengt inne». Utdanningsetaten er i starten av en planprosess for utbygging av Bjerke vgs, og Linderud skole er under vurdering for oppgradering. Skoleelevene etterlyser en bedre skolegård og det er potensial for å integrere skolens uteområder bedre i nærmiljøet. Ved en eventuell flytting av biblioteket på Bjerke til Linderud vil det være viktig å se på hvordan lokalisering av biblioteket bidrar til stedsutviklingen i «sentrum» av Linderud. Prosjektet skal sikre en helhetlig utvikling og en systematisk prioritering av små og store tiltak som skal gjennomføres i løpet av siste del av Groruddalsatsingen. Trygghet, tilgjengelighet og møteplasser vil være bærende elementer i utviklingen av en strategi som er hovedleveransen i prosjektet. For å få til de endringene som ønskes av nærmiljøet er dialog og samarbeid viktig for utarbeidingen av strategien. I prosjektet skal enkeltpersoner, foreninger, lag, borettslag, næringsliv og kommunale virksomheter lage en felles strategi for hvordan Linderud kan utvikles på kort og lang sikt. Bydel	

	Bjerkens rolle blir i stor grad å koble folk og virksomheter sammen, lede prosesser som konkretiserer strategien og å bistå med kompetanse og tid. Bydelen ønsker et tettere og mer systematisk samarbeid med Plan- og bygningsetaten for å sikre kvalitet, helhet og framdrift.
Støtter delmål	Delmålene 1 - 4 ligger til grunn som prinsipper for utarbeidelsen av planen. Direkte støtter prosjektet delmål 5 og 6
Hovedleveranser i 2020	- En integrert planstrategi for utviklingen av Linderud hvor alle grunneieres planer sees i sammenheng - Samarbeidsavtaler med grunneiere - Medvirkningsprosesser - Helhetlig belyningsplan - Strakstiltak: søppelkasser, benker og sykkelstativ, reparasjon av dekke i gangvei. Rydde sving sør for Linderud gård bhg - Midlertidig tiltak/tester for aktivisering av sonen mellom skolene, barnehagene og senteret

Prosjekt	2.3-19	BOMILJØ LINDERUD
varighet	2019-2022	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	På bakgrunn av bomiljøundersøkelsen i regi av Leieboerforeningen vil det søkes utvidet samarbeid med sameiene/ borettslag om bomiljøtiltak	
Prosjektfase og fasens varighet	01.20 - 03.20 Planlegging 04.20 - 12.20 Gjennomføring	
Søknadssum	1.000.000	
Kostnader	Prosjektledelse Fysiske og sosiale bomiljøtiltak i regi av eller i samarbeid med lokale aktører Bomiljøseminar Oppfølging av bomiljøundersøkelsen	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Bomiljøet på Linderud er preget av at det er stor utleieandel og høy flyttefrekvens i sameiene, noe som bidrar til at det er svake sosiale nettverk mellom beboerne og lavere deltakelse i lokalsamfunnet enn i mer stabile boligområder. Stedsanalysen har også dokumentert en tendens til mistillit mellom grupper i bomiljøene. Det er relativt få frivillige foreninger, få fellesarrangementer og mangel på innendørs og utendørs møteplasser og rekreasjon for ulike målgrupper. Ensomhet blant eldre og foreldre er en problematikk som har kommet opp i arbeidet med stedsanalysen, og utenforskap blant barn og ungdom bidrar til et mer utrygt oppvekstmiljø. Samtidig uttrykker beboerne trivsel med egen nærområde, og det er ulike foreldregrupper som er engasjert i å skape gode oppvekstmiljøer. Elevene ved skolen har tatt initiativ til å forskjønne skolegården og nærmiljøet. Disse ressursene er det viktig å støtte opp under og bygge videre på i bomiljøarbeidet. Målsetningen med prosjektet: - Støtte opp under beboerinitiativ - Bistå beboere og styrene i sameiene med å etablere gode møteplasser for ulike aldersgrupper og med generelt bomiljøarbeid - styrke de sosiale nettverkene og legge til rette for mer aktivitet og deltakelse - fremheve og forsterke nærmiljøkvaliteter (gangveier, uteområder, boligområdene)	
Støtter delmål	1, 2, 3, 4	
Hovedleveranser i 2019	- Bomiljøkonferanse på Linderud - Få opp flere beboergrupper som jobber med konkrete bomiljøtiltak (Aktivitetsrom i Linderud 1, gatefest, hundepark, rydding og forskjønnings) - Trygghetsmobilisering (natteravner i ulike former) - Beboersamlinger, kafémøter - Arrangementer som virkemiddel for å bygge sosiale nettverk (fysiske trygghetstiltak som belyningsplan sorterer som leveranse i fysisk utviklingsplan, mens beboermedvirkningen er leveranse i bomiljø).	

Prosjekt	2.8-17	VOLLEBEKK FABRIKKER
varighet	2017-2020	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	Ja, dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Bjerke, eiendomsutviklere OBOS, Aspelin Ramm og nettverket Pådriv.	
Prosjektfase og fasens varighet	Konseptfase og planlegging 2017 Gjennomføringsfase 03.18-08.20 , videreføring/testing av modell på Linderud Avslutningsfase: 09.20-12.20	
Søknadssum	900.000	
Kostnader	Prosjektledelse Driftsutgifter fabrikken (fordelingsnøkkel mellom partnere) evaluering	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Vollebekk fabrikk er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og Pådriv. Utgangspunktet var at næringsbygg på Vollebekk stod tomme i påvente av bygging av et nytt boligområde på Vollebekk. Prosjektet ble etablert som midlertidig tiltak med felles målsetninger: • Utvikle Vollebekk som et aktiv og godt nærmiljø ved å mobilisere beboere og lokalt næringsliv. • Bidra til at utviklingen av Vollebekk-området får en bærekraftig profil og blir et inkluderende sted for hele nærmiljøet • Danne nye nettverk for beboere som fremmer samfunnsdeltakelse. Skape et inkluderende møtested, med en aktivitets- og læringsarena for alle deler av befolkningen. • Gjøre temaene bærekraft, gjenbruk og sirkulær økonomi mer tilgjengelig. Vollebekk fabrikk huser 38 virksomheter som er har trippel bunnlinje (økonomi, miljø og sosial bærekraft), til sammen har de 100 arbeidsplasser og hatt over 100 mennesker på arbeidstrening siden oppstart, og det har vært over 100 arrangementer. Bydel Bjerkes rolle i partnerskapet er særlig knyttet til den sosiale dimensjonen som omhandler å skape inkluderende og aktivitetsfremmende møteplasser for lokalbefolkningen. Fabrikken har egen driftsøkonomi og har inntekter gjennom utleie og arrangementer i tillegg til det partnerne går inn med i grunnstøtte. Vollebekk fabrikk er en partner i miljøhovedstadsåret, og har fått internasjonal interesse bl.a. Urban Future Conference, og er med i Urbact nettverket sammen med Renovasjonsetaten for å dele erfaringer og se på sirkulær økonomi i praksis. I 2020 vil bydelen teste ut en modell med erfaringer fra Vollebekk fabrikk i næringslokaler på Linderud som et eget prosjekt (se egen prosjekt).	
Støtter delmål	1, 3, 5, 6	
Hovedleveranser i 2020	• Drift av fabrikken • Aktiviteter og arrangementer i regi av leietakerne/ virksomhetene, foreninger og lokale grupper (syverksted, sykkelverksted, yoga) • Evaluering av Vollebekk fabrikk, rapport. Påbegynt 2019 • Konsept for videreutvikling av VF når byggene rives i 2021 • Lage bærekraftig driftsmodell for B9Sykkelfix, et tiltak for å få ungdom i jobb, startet med støtte fra miljøhovedstaden.	

Prosjekt	2.7-17	LINDERUD GÅRD
varighet	2017-2023	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	Ja, med Museene i Akershus og Bymiljøetaten	
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept, planlegging 2017-2018 Gjennomføring: 01.19-12.22 Avslutning: 2021	
Søknadssum	500.000	
Kostnader	Belysning, åpning av porter mot Linderud skole og Sauredalen, blomstereng, etablering av andelsgård	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Linderud gård er en historisk og herskabelig gård med et stort parkanlegg i hjertet av Linderud. Gårdsanlegget eies av en privat stiftelse og driftes av Museene i Akershus (MIA). Området har et stort potensial som møteplass, og bydelen samarbeider tett med MIA om å utvikle stedet med tett involvering av beboerne. Målet er at Linderud gård skal være en flerfunksjonell og inkluderende møteplass for befolkningen som bidrar til å heve Linderuds omdømme og fremme lokalhistorie og landbrukstradisjoner. Gårdsanlegget skal være godt integrert i Linderudområdet som helhet. Det er også et mål at lokalhistorien som MiA forvalter skal løftes fram for lokalbefolkningen og bidra til å styrke lokal identitet. Mulighetsstudien fra 2018 har utløst finansiering fra bl.a. Sparebankstiftelsen og Bymiljøetaten (urbant landbruk), og det er realisert eller initiert en rekke tiltak: Klatrepark, oppstart av andelsgård, gårdsbutikk, sosiale arrangementer. Målet med den videre innsatsen er å koble ressurser i nærmiljøet tett på utviklingen av andelsgården, knytte gården tettere på skolen(e), mobilisere nærmiljøet til å «ta vare på» på gårdsanlegget som er noe utsatt for hærverk. Det er for øvrig et mål at gården blir bedre tilgjengelig og integrert i omkringliggende områder, ved hjelp av gangveier, skilt og belysning, samt arrangementer i samarbeid med lokale virksomheter og beboere.	
Støtter delmål	1, 3, 4	
Hovedleveranser i 2020	• Oppstart av Linderud gård nærmiljøhage med andelsjordbruk • Teste «bydelsandel» i andelsjordbrukmodellen, en andel som har noen andre forutsetninger og plikter en den vanlige andel, men som har hensikt å inkludere forskjellige brukergruppe som kan komme hit og oppleve mestring og aktivitet. For eksempel psykisk helse, rus, og barnehager. • Trygghetsmobilisering, mobilisere nærmiljøet for å vokte og passe på Linderud gård som en del av bomiljø på Linderud prosjektet • Belysning, som et tiltak fra trygghetsvandring og fysisk plan. • Ny port/ inngang ved vestre jorden • Skiltprogram eller andre tiltak som løfter lokalhistorien fram i nærmiljøet	

Prosjekt	MIDLERTIDIG AKTIVERING AV LOKALER
varighet	2019 – 2024
Søker	Bydel Bjerke
Samarbeidsavtale	Vi er i innledende dialog med Stor-Oslo Eiendom og Fearnley etter at de nylig kjøpte eiendommen fra Oslo Business Park.
Prosjektfase og fasens varighet	Konseptfase: 08.19-04.20 Planlegging: 04.20-06.20 Gjennomføre: 06.2020 – 12.24 Ettersom dette er en pilot der vi tester konsepter underveis, vil fasene gå noe over i hverandre
Søknadssum	1.500.000
Kostnader	Prosjektledelse, husleie, etableringskostnader, aktiviteter
Mål og begrunnelse for prosjektet	Det er behov for møtesteder, arbeidsplasser og aktiviteter på Linderud generelt og i Linderudveien spesielt. Det er svake sosiale strukturer i området, og mange som er uten aktivitet på dagtid. Særlig mange kvinner er uten arbeid og aktivitet. Vi merker også et økt innslag av familier fra Øst-Europa. Bydelen ønsker å koble det behovet opp mot tomme lokaler i næringsparken Oslo businesspark ved Siemensbygget (nylig overtatt av Stor-Oslo Eiendom), og vil bruke erfaringene fra Vollebekk fabrikker til å skape et lignende miljø for samarbeid og felleskap på tvers av sektorer og bransjer. Eierne av Oslo Businesspark er interessert i få til aktivitet i lokalene, og tilbyr bydelen å teste ut ulike konsepter for aktivitetsarenaer. Næringslokalene huser i dag flere teknologibedrifter, og det er et mål å prøve ut systemer for samarbeid med lokalt næringsliv. Midlertidig aktivering av tomme lokaler er en strategi for å stimulere til stedsutvikling. Næringsparken ligger tett på det etablerte bomiljøet på Linderud, og utviklingen i områdene vil påvirke hverandre gjensidig. Bydel Bjerke er derfor opptatt av å bidra til at området integreres godt i delbydelen for øvrig, og at det skjer i dialog med nærmiljøet. Erfaringene fra Vollebekk fabrikker vil være viktige i konseptutviklingen, samtidig som forutsetningene er ulike, og modellen på Linderud vil i større grad være knyttet opp mot lokale aktører og aktiviteter for og med beboerne. Bydelen vurderer å flytte Bjerke nærmiljøsender (Brobekk), ser testing av aktivering av lokaler i Oslo businesspark som viktig innsikt ifm lokalisering av nærmiljøsenderet.
Støtter delmål	1, 3, 4, 5
Hovedleveranser i 2020	- Etablering av en midlertidig lavterskel mestringsarena for organisert og uorganisert aktivitet - Etablere et nettverk at grupper og miljøer innen kunst, musikk, IT og knytte dem til lokale beboere og foreninger. - En modell for organisering og finansiering der ressurser fra næringslivet bidrar til å finansiere aktivitet for og med barn og unge - En modell for drift av aktivitetshuset

Prosjekt	2.1-19	UNGDOMS-AKS
Prosjektets	2019-2020	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale foreligger	Det er etablert samarbeid med skolen	
Prosjektfase og fasens varighet	01.19-04.19: Konseptfase 05.19-08.19: Planlegging 09.19-12.19 Gjennomføre 01.20-12.20: Evaluere, korrigere, videreføre	
Søknadssum	500.000	
Kostnader	Instruktører, bemanning	
Mål og begrunnelse for prosjektet	I lokal medvirkningsprosess i bydelen knyttet til Ung i Oslo-kartleggingen, melder ungdomsskoleelever om behov for arenaer for å være sammen og variert aktivitetstilbud rett etter skoleslutt. Elevene ønsker at skolens fasiliteter benyttes. I tillegg til å dekke de konkrete behovene, vil prosjektet kunne bidra til å øke fellesskap og tilhørighet og bidra til at skolen blir en enda mer sentral lokalsamfunnsarena. Fra høsten 2019 er det gjennomført testing av etter-skoletid-tilbud 2 ganger i uka i samarbeid med Linderud skole; ett for jenter og ett for gutter, 5-7. trinn, der ungdommer ("legender") fra ungdomsskolen er med frivillig for å gjennomføre aktiviteter for de yngre. De får attest for frivillig arbeid. Veitvet: etter-skoletid-tilbud på klubben for ungdom (8.trinn-17 år) 3 dager i uka, 2 dager for junior (5-7. trinn). Tilbudene består av bespisning, sang, dans, fysisk aktivitet, bingo, kunst og håndverk, spill/wii, bordtennis, biljard, uteaktivitet, samt sterk fokus på sosial kompetanse. Bydelen vil i 2020 evaluere testperioden, og trolig spisse tilbudet mer inn mot Linderud, i tilknytning til samarbeidet med skolen.	
Støtter delmål	1, 2 og 6	
Hovedleveranser i 2020	- Gjennomføre og videreutvikle ungdoms-Aks - Evaluering av testperiode og vurdere overføringsverdi til eldre ungdom	

Prosjekt	TRYGGHETSPROSJEKT LINDERUD
Varighet	2020-2021
Søker	Bydel Bjerke
Samarbeidsavtale	Nei
Prosjektfase og fasens varighet	01.20-03.20: Konseptfase 04.20-06.20: Planleggingsfase 09.20-12.21: Gjennomføringsfase
Søknadssum	2.000.000
Kostnader	Prosjektledelse og oppfølging Testing av tiltak: lørdagsåpent, treningskort
Mål og begrunnelse for prosjektet	En kombinasjon av økende kriminalitet, uro og omfattende medieoppslag bidrar til å skape en opplevelse av utrygghet hos flere innbyggere på Linderud. Bydelen har mange primærforebyggende tiltak for barn og ungdom; tiltak som er rettet mot hele befolkningen med sikte på å hindre at problemer oppstår. Det er behov for å utvikle metoder og tiltak som er sekundær- og tertiærforebyggende. <i>Med sekundærforebygging menes innsats som retter seg mot grupper av barn og unge hvor det finnes høy risiko for at vansker kan oppstå. Tertiærforebyggende tiltak retter seg mot grupper eller individer med tydelig identifiserte problemer for å snu en negativ utvikling og begrense konsekvensene.» (Rundskriv Q-16/2007: Forebyggende innsats for barn og unge).</i> Bydelen har per dags dato ikke et godt nok tilbud til denne gruppen og ønsker gjennom medvirkning å utvikle en helhetlig tilnærming som innebærer bedre samordning av tjenester, etablering av mestringsarenaer og samarbeid med nærmiljø og lokal næringsliv. Prosjektet består i å utvikle konsepter for tverrfaglig og tversektorielt samarbeid om å skape gode mestringsarenaer for risikoutsatt ungdom, der både frivillig arbeid, kompetansebygging, jobb, møtesteder og aktivitet er sentrale elementer. Det innebærer innsiktsarbeid, medvirkning, testing og utvikling av nye arbeidsformer. Prosjektet grenser opp til Salto-arbeidet og bydelens oppfølging av unge gjengangere, og det er et suksesskriterium at vi jobber med overgangene mellom ulike fagområder og tjenester.
Støtter delmål	3 og 6 primært, men også 1 og 2
Hovedleveranser i 2020	• Kartlegging og avgrensning av målgruppe, inkl. kunnskapsinnhenting, brukerreise og en «bakoverskuende innsiktsstudie» • Konseptutvikling oppfølging av unge gjengangere • Konseptutvikling program for mestring og rollemodeller • Testing av tiltak: ◦ Lørdagsåpen klubb for 16+ ◦ Treningsgrupper/aktivitetskort for utvalgte ungdommer

Prosjekt	BIBLIOTEK
varighet	2019-2021 (defineres i utredning/konseptfase)
Søker	Bydel Bjerke og Deichman
Samarbeidsavtale	Innledet samarbeid mellom Deichman, Bydel Grorud og Bydel Bjerke, forankret på direktørnivå. Formaliseres 1. første kvartal.
Prosjektfase og fasens varighet	Konseptfase og planlegging: jan 2020-april 2020 Gjennomføring: april 2020-des 2021
Søknadssum	2.300.000 – hele beløpet søkes ut av Deichman.
Kostnader	Prosjektledelse 50 % (deler stilling med BGR): 400.000 Lokaler: 650.000 (leie, oppussing) Aktivitør: 800.000 Aktiviteter/innhold: 150.000 Jobb for ungdom: 300.000
Mål og begrunnelse for prosjektet	I forbindelse med ny biblioteksplan har Bydel Bjerke hatt kontakt med Deichman vedrørende etablering av filialer i vår bydel. Filialen på Bjerke må flyttes når nåværende bygning rives for å bygge boliger, og det planlegges å etablere et bibliotek på Økern. Linderud senter er et knutepunkt i denne delen av Groruddalen og vil nå måltallene for besøk, og man vil styrke tilbudet til en del av befolkningen som det er ønskelig at benytter bibliotek i større grad. Bibliotek på Linderud vil ha gode forutsetninger for å være en møteplass for integrasjon og inkludering. Her går skillet mellom øst og vest i bydelen. Citycon som eier Linderud senter er også eiere av Stovner senter og har gode erfaringer fra etableringen av biblioteket der, som de ønsker å trekke med seg i utviklingen av Linderud senter. Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Deichman har innledet et samarbeid om å pilotere «pop-up»-bibliotek på hhv Linderud og Romsås som en del av utredningen av bibliotekstilbudet i Groruddalen, som står som en bestilling i biblioteksplanen. Biblioteksfilialene på Bjerke og Nordtvet har i det siste hatt store ungdomsgjenger som bruker biblioteket på dag- og kveldstid (også når biblioteket er ubetjent). De har skapt en del uro og forsøpling. Det understreker behovet for et sted å være, og det er ønskelig å involvere ungdomsgrupper tett i utviklingen av en evt permanent filial på Linderud. Det vil derfor i pilotperioden være aktuelt å ansette ungdommer i deltidsstillinger samt gjennomføre målrettede medvirkningsopplegg særlig med denne målgruppen.
Støtter delmål	1, 2, 3, 4, 5, 6
Hovedleveranser i 2019	- Konseptvalg for lokalisering av filial i Linderud-Bjerke-området - Utredning av biblioteksbehov i Groruddalen - Gjennomføring av pilot/test av pop-up-bibliotek på Linderud, inkludert samarbeid med Renovasjonsetaten, Vollebekk fabrikk, lokale foreninger - medvirkning - arrangementer, språkkafé, leksehjelp, m.m.

Prosjekt	2.1-18	MØTEPLASSER
Varighet	08.2018 – 12.2023	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	Inngått leieavtale (5+5 år) med gårdeier i Linderudsletta 13	
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept – 08.2018 – 04.2019 Planlegge – 04.2019 – 12.2019 Gjennomføre – 01.2020 – 12.2024	
Søknadssum	1.750.000	
Kostnader	Prosjektledelse Oppussing og teknisk tilpasning av lokalet	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Sletteløkka har ingen innendørs møteplasser eller forsamlingslokaler, ingen offentlige funksjoner eller tilbud. Det er noen få utendørs lekeplasser og sittegrupper. Dette bidrar til å opprettholde svake sosiale nettverk og manglende tillit mellom beboerne i området. Bydelen har inngått leieavtale for underetasjen på Jokerbutikken, og gjennom 2019 bistått lokale foreninger (Sletteløkka Vel, Sletteløkka arrangementer), sameier og borettslag, og beboere i en prosess med å få på plass et grendehus. Prosjektet er tungt forankret i lokalmiljøet, og planlegging og oppussing skjer på dugnad, med mål om utstrakt bruk av gjenbruksmaterialer. Prosessen er ledet av tre arkitekter som stiller opp gratis i samarbeid med prosjektleder fra bydelen. Behovsbeskrivelse, teknisk planlegging og design gjennomført i 2019. Arbeidsformen (dugnad, ombruk, bred involvering) kan ha overføringsverdi til etablering av felleshus i andre områder. På lengre sikt vil det være aktuelt å vurdere forsamlingslokaler i tilknytning til barnehage, aktivitetshall, e.l. hvis dette oppføres.	
Støtter delmål	1,2,3,4	
Hovedleveranser i 2020	- Etablere møteplass i Linderudsletta 13. - Beboere pusser opp lokalet på dugnad og med bruk av ombruksmaterialer - Driftsmodell for lokalet som ivaretar åpne fellesaktiviteter for enkelte målgrupper, på tvers av grupper og for særbruk til egen aktivitet. - Støtte evt. initiativ fra boligselskapene om etablering av egne, større lokaler. - Påvirke igangsetting av planer for ny barnehage Utfartsveien – og følge opp planprogrammet for Rødtvet ved politisk behandling i bystyret. - Påvirke behovsplan for idrett og friluftsliv, slik at det innarbeides planer om en Fysak-hall / lokaler for selvorganisert fysisk aktivitet og kultur, i nærheten av Sletteløkka.	

Prosjekt	2.4-19	BO GODT PÅ SLETTELOKKA
varighet	2018-2026	
Søker	Bydel Bjerke	
Samarbeidsavtale	Avtale med Sletteløkka Arrangementer om «strømidler» til bomiljøtiltak. Aktuelt å inngå avtale med Sletteløkka Vel vedr. arbeid med Trondheimsveien og innsats for å bedre forholdene til leietakere	
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept – 08.2018 – 04.2019 Planlegge – 04.2019 – 10.2019 Gjennomføre – 10.2019 – 12.2025 Avslutte – 2026	
Søknadssum	1.000.000	
Kostnader	Prosjektledelse Støtteordning Sletteløkka Arrangementer Støtte til velforening for å engasjere fagmiljø innen beboermedvirkning samt utredning av trafikale forhold	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Sletteløkka er en lang smal gate med et rikt mangfold av mennesker fra ulike kulturer og ikke minst er det Bydel Bjerkes mest barnerike gate, med til sammen 2500 innbyggere, hvorav 30 % er under 20 år – 50 % under 30 år – 5 % over 67 år. Folk på Sletteløkka setter pris på nærhet til skogen og god tilgang til kollektivtransport, handel og fritidstilbud på hhv. Linderud og Veitvet. Mange beboere uttrykker samtidig bekymring og engasjement vedrørende trafikkforhold, forsøpling, støy og manglende vedlikehold. Det pekes på at naboer kjenner hverandre dårlig, generasjonsmotsetninger og lav deltakelse på fellesarrangementer, og beboere – særlig ungdom - etterlyser flere aktiviteter og oppholdssteder ute og inne. Utenom styrene i de tre boligselskapene, er det to organisasjoner Sletteløkka Vel (stiftet 2019) og Sletteløkka arrangementer. Langsiktige mål for bomiljøarbeidet: 1: Å skape en trivelig gate på barns premisser, der bilen tar mindre plass. 2: Å skape et robust nabolag der folk kjenner hverandre og løser felles utfordringer.	
Støtter delmål	1, 2, 3, 4	
Hovedleveranser i 2020	• Tildeling av støtte til «små og kreative bomiljøtiltak» • Kurs og veiledning overfor leietakere og utleiere om rettigheter og plikter ifm leieforhold • Beboerdrevet nettverksgrupper som jobber med de konkrete bomiljøutfordringer. Arbeidsgrupper tilknyttet velforeningen som jobber for tiden med forsøpling, støy, trafikk og utfordringer for leietakere • Støtte til Sletteløkka Vel i arbeidet med støyforurensing, og bistå ved behov i kontakt med relevante offentlige etater • «Møteplassen 21B» etablert som en rekrutteringsarena til barnehage (Finansieres av andre midler, samarbeider med nærmiljøprogrammet) • Arrangementer – søke samarbeid med kadettene på Krigsskolen • Støtte opp om selvdrevne aktiviteter, etter initiativ fra beboere, i form av veiledning, lokaler, økonomisk	

Prosjekt	BOMILJØVAKT
Prosjektets	2020-2021
Søker	Bydel Bjerke og Bymiljøetaten
Samarbeidsavtale	Nei
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept og planlegging: jan 2020-mars 2020 Gjennomføring: april 2020 – nov. 2021 Avslutning: des. 2021
Søknadssum	1.400.000
Kostnader i 2020	Bomiljøvakter i turnus Etableringskostnader
Mål og begrunnelse for prosjektet	Et boligområde i den østlige enden av Sletteløkka består av brakkelignende boliger med svært lav standard. Det er rundt 40 utleiehybler i brakkene som i hovedsak leies ut til enslige menn med dårlig økonomi og helse, samt psykiatri og rusproblematikk, gjerne fra hele Oslo. Det er stor gjennomtrekk av beboere. Mange av beboerne får tett oppfølging fra bydelens tjenester. Standarden på boliger og bomiljø er ikke tilfredsstillende. Både beboerne og naboer har opplevd stedet negativt og utrygt. Skolebarn gir uttrykk for at det føles utrygt å passere området, og flere går alternative veier til og fra skolen på Rødtvet. Bydelen ønsker å gjennomføre en konsentrert innsats på en enkeltadresse ved å etablere en bomiljøvakt etter modell fra Refstadveien 100, der lignende tiltak er gjennomført med stort hell. Bomiljøvakten skal jobbe aktivt med fysiske og sosiale bomiljøtiltak inne på området og følge opp og kartlegge enkeltbeboere med mål om ekspedere dem videre til mer stabile boliger utenfor området. Modellen vil kunne ha overføringsverdi til andre blokker eller konsentrerte boligområder med denne typen beboere. Både fra et sosialfaglig og bomiljømessig perspektiv er det ønskelig at «brakkeboligene» på sikt avvikles, og at området utvikles med fellesskapsfunksjoner som for eksempel barnehage eller flerbrukshall.
Støtter delmål	3, 4, 5
Hovedleveranser i 2020	- Kartlegging av beboere - Etablere bomiljøvakt - Testing i småskala av ulike modeller, konseptvalg

Prosjekt	2.5-19	VEITVETPARKEN
varighet	2019 – 2020	
Søker	Bydel Bjerke og Bymiljøetaten	
Samarbeidsavtale	Bymiljøetaten gjennomfører belyningsplan	
Prosjektfase og fasens varighet	Konsept: 01.2019-07.2019 Planlegging: 08.2019-12.2019 Gjennomføring (sosial, BBJ): 06.2019-12.2020 Gjennomføring (fysisk, BYM): 04.2020 (ikke helt tidfestet)	
Søknadssum	1.700.000 – det kan komme ytterligere søknad ila året	
Kostnader	BBJ: (700.000) Prosjektledelse, arrangementer og samarbeidstiltak med sportsklubben og øvrige foreninger, Skolehageutstyr BYM: (1.000.000) Oppgradering Evt ubrukte 2019-midler til belysning (BYM) kommer i tillegg	
Mål og begrunnelse for prosjektet	Veitvetparken ble anlagt i forrige Groruddalssatsing mellom bomiljøene på Linderud og Veitvet, og har blitt en god møteplass i nærmiljøet. Ettersom det er få lekeområder mellom blokkene, har bydelen gjennom GDS bygget aktivitetspunkter og oppgradert gangvei og friluftsområder i tilknytning til parken. Da nye Veitvet skole ble bygget, ble det gamle SFO-huset stående, og driftes i dag av Veitvet sportsklubb. Foreldregrupper på Veitvet skole har tatt initiativ til å etablere skolehage i parken. Parken og huset har potensial til å bli en flerfunksjonell og aktiv møteplass både inne og ute med aktiviteter gjennom hele året. Manglende belysning og slitasje på parkanlegget gjør imidlertid at parken oppleves som utrygg på ettermiddag/kveldstid. I 2019 ble det gjennomført en medvirkningsprosess om belysning, og BYM har laget en belyningsplan, samt startet prosjektering og gravearbeider. Ferdigstillelse av belyningsprosjektet skjer ila første tertial 2020.	
Støtter delmål	1,2,3,4	
Hovedleveranser i 2020	- Realisering av belyningsplan, gjennomføres av BYM med midler tildelt i 2019 - Utrede behov for oppgradering av anlegg - Samarbeid med Veitvet sportsklubb om utvikling av SFO-huset til et inkluderende grendehus for nærmiljøet - Lysfest og andre arrangementer i samarbeid med nærmiljøaktører	
